6 TIMING SCHEDULE

Extension and rehabilitataion of Narva Water and Wastewater network ISPA (2001/EE/16/P/PE/008)

Task Name	Start	Finish
Pipe section Uusküla Str.	Wed 1.10.08	Wed 29.10.08
Pipe section Joala Str.	Mon 15.09.08	Thu 16.10.08
Pipe section Mõisa Str.	Tue 16.01.07	Fri 16.03.07
Pipe section Kreenholmi Str.	Wed 16.05.07	Fri 9.11.07
Pipe section Kerese Str.	Wed 7.03.07	Fri 30.11.07
Pipe section Tallinna Str.	Mon 1.09.08	Fri 21.11.08
Pipe section Linda Str.	Wed 27.08.08	Thu 2.10.08
Pipe section Kangelaste Str.	Tue 19.08.08	Tue 7.10.08
Renovation of pumping stations	Tue 6.05.08	Fri 19.09.08
Work area Siiversti	Thu 3.05.07	Thu 31.01.08
Work area 14	Tue 13.11.07	Mon 17.11.08
Work area 15	Tue 27.02.07	Fri 5.10.07
Work area 16	Mon 16.07.07	Wed 4.06.08
Work area 17	Mon 14.05.07	Fri 14.11.08

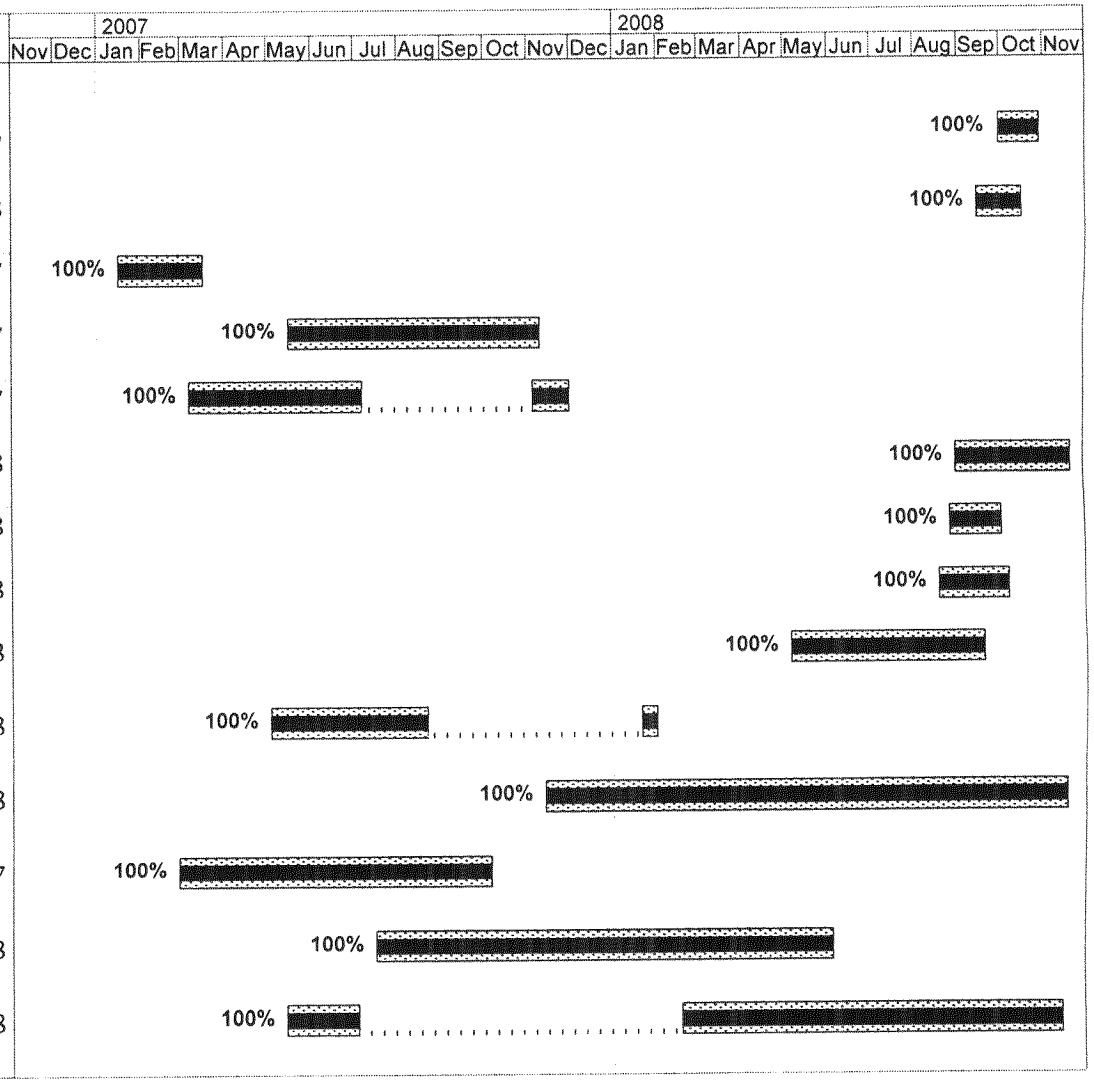

Start, Finish and Percentage of the implementation of the Tasks is taken based on the Construction works.
